

高砂埋立護岸整備 進捗状況 【令和7年4月末時点】

令和7年5月12日

	工事名	工期
完了 工事	① R5(0県)ケーソン製作工事	R6.2.20~R6.9.6
	② R5(0県)ブロック製作工事	R6.2.26~R6.9.27
	③ R5(0県)基礎工事	R6.3.6~R6.8.30
	④ R6 ブロック製作工事	R6.5.29~R7.3.31
施工 中 工事	⑥ R6 ケーソン製作工事	R6.6.26~R7.1.20
	⑦ R6 ケーソン据付工事	R6.6.24~R7.1.31
	⑤ R6 基礎工事	R6.5.29~R7.5.30
	⑧ R6 ケーソン製作工事(2)	R6.10.1~R7.5.30
	⑨ R6(債務)根固ブロック製作工事	R6.11.29~R7.6.30
	⑩ R6(債務)ケーソン製作工事(南)	R7.1.17~R7.7.31
	⑪ R6(債務)ケーソン据付工事(1)	R7.2.25~R7.9.30
	⑫ R6(債務)ケーソン据付工事(2)	R7.2.18~R7.10.31
	⑬ R6(債務)ケーソン据付工事(南)	R7.3.3~R7.10.31
	⑭ R6(債務)ケーソン製作工事(西)	R7.3.18~R7.10.31
	⑮ R6(債務)基礎工事	R7.3.24~R7.10.31



電子地形図(国土地理院)を加工して作成

宮野浦・フローティングドック



高砂・仮置きヤード



R6年8月末



9月末



10月末



11月末




12月末



R7年1月末 3月末まで変わりなし



4月末

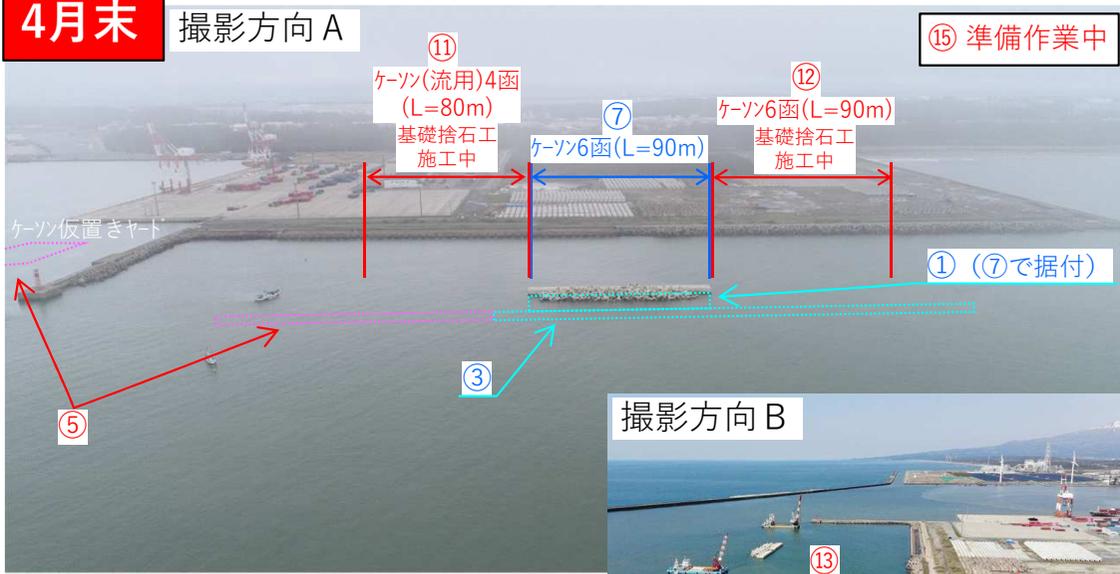

撮影方向B

