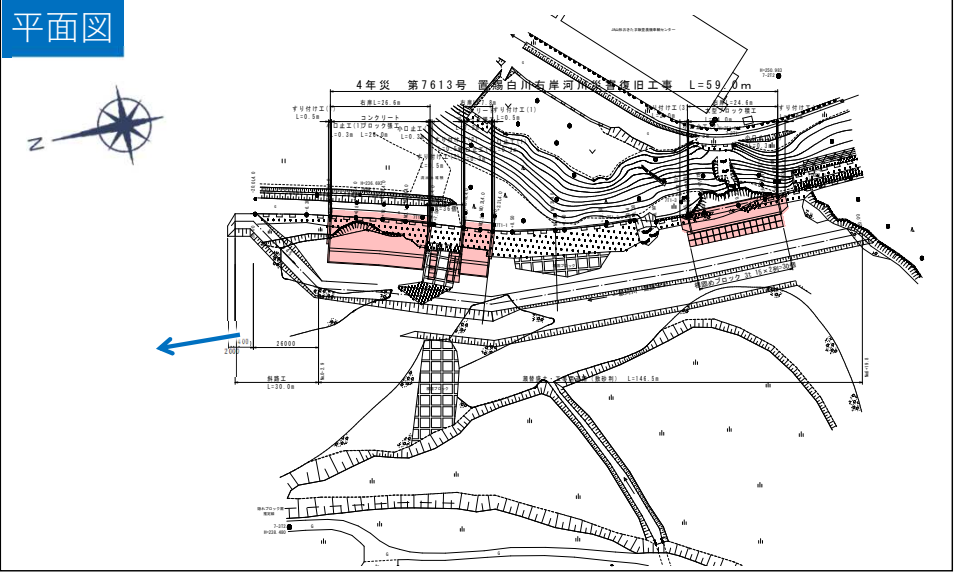
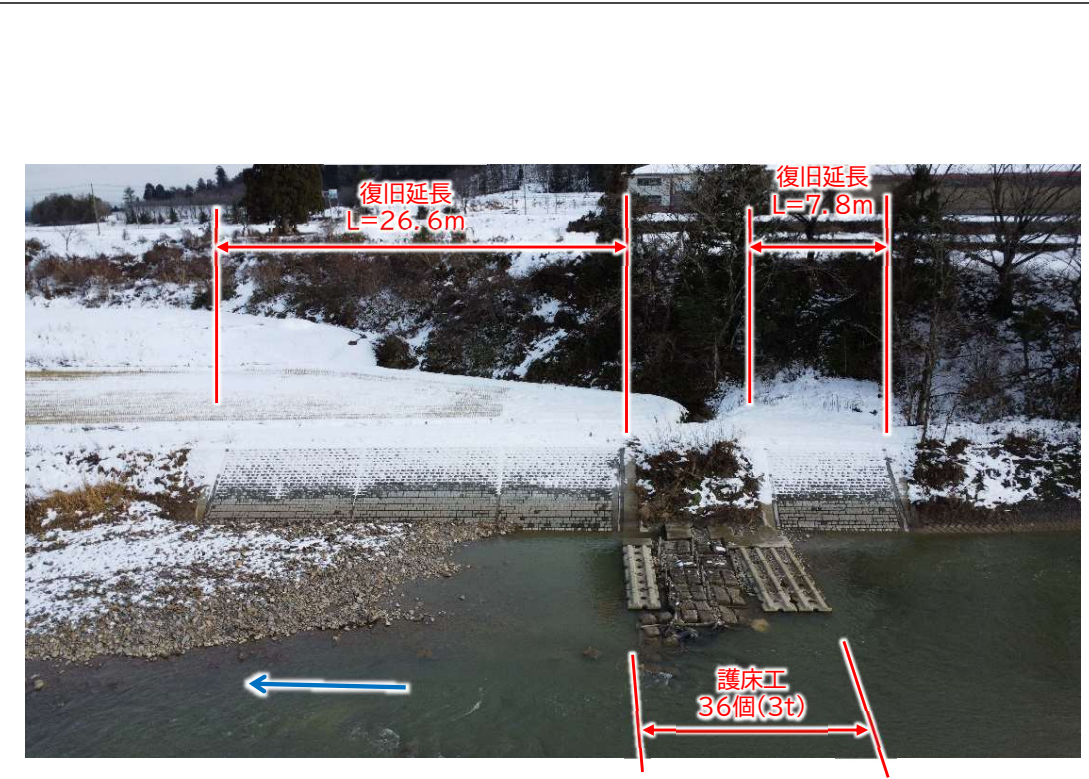
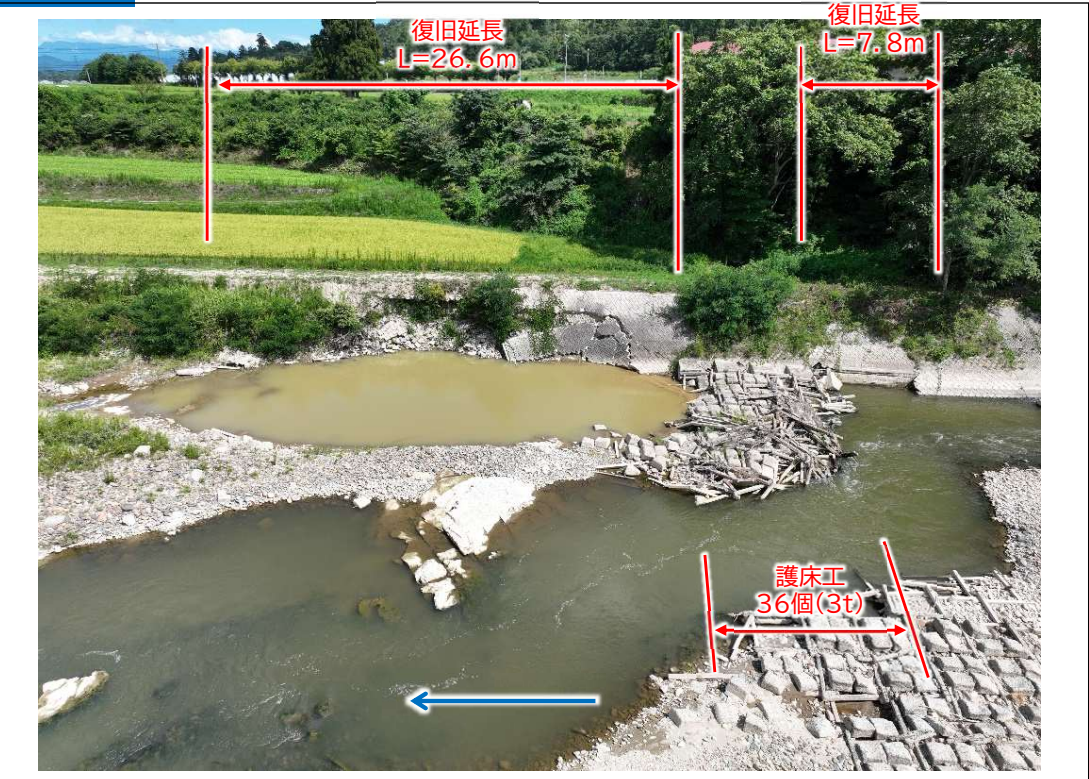


29. 令和4年災第7613号置賜白川河川等災害復旧工事（西置賜郡飯豊町大字小白川（3）地内）概要

- 被災概要
- 河川名：一級河川置賜白川
- 箇所：西置賜郡飯豊町大字小白川（3）地内
- 被災延長：L=59.0m
- 被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨
- 復旧工法：ブロック張(1:1.5)、大型ブロック積(1:0.5)
- 使用ブロック：美山-S、パラルフォームII（共和コンクリート工業）
- 工期：令和5年7月12日～令和7年3月31日
- 受注者：樋口建設株式会社
- 特記事項：護床、根固めブロック（ビーハイブ3t）
重変協議あり



完成写真

撮影日：令和7年3月下旬

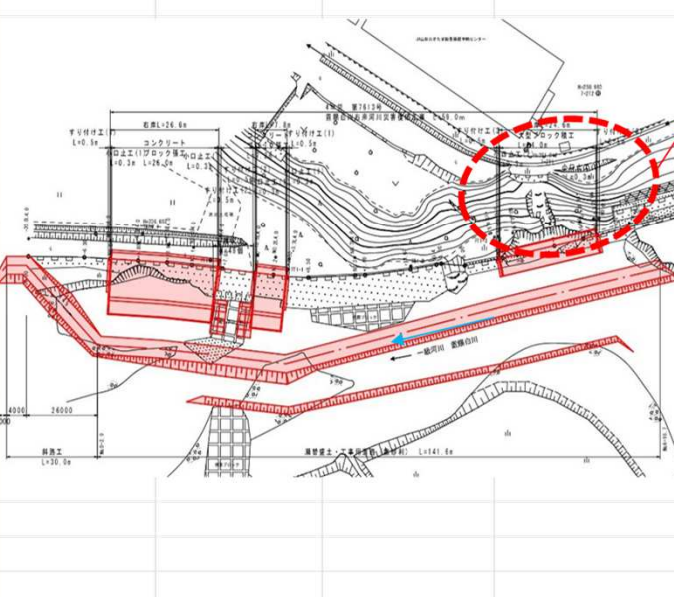

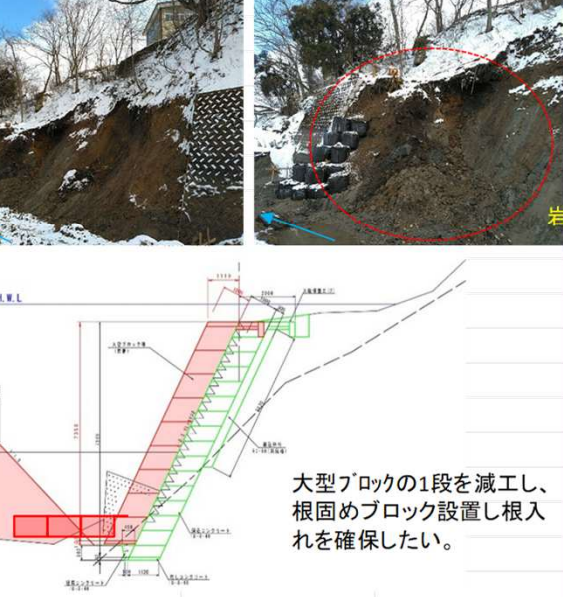
29. 令和4年災第7613号置賜白川河川等災害復旧工事（西置賜郡飯豊町大字小白川（3）地内）概要

被災写真

完成写真 撮影日：令和7年3月下旬



※重変協議あり
護岸前出
根固めブロック併用

査定決定内容・考え方	設計変更協議の原因	変更内容・考え方
豪雨による出水により既設護岸が被災したため、原形復旧を基本に護岸工を申請し、実地査定の結果、申請どおり採択を受けた。	・大型ブロック積工を施工するため設計に基づき掘削を行ったところ、地山の崩落が確認された。岩盤と土砂層が護岸掘削に斜めに入りこんでおりいることから、設計で示す掘削断面確保が困難となった。	・護岸法線を前出しし、加えて護岸根入れを浅くする代わりに根固めブロックを設計変更したい。
		 <p>大型ブロックの1段を減工し、根固めブロック設置し根入れを確保したい。</p>
